



UNINETT's prosjektrammeverk
Erfaringsmøte, DIFI

Bjørn H. Kopperud
4. november 2011

Hvorfor et felles rammeverk?

- Enhetlig håndtering av prosjekter sikrer bedre gjennomføring og resultat
- Mer effektiv prosjektgjennomføring
- Sikre at prosjektene er i henhold til konsernets strategi
- Sikre at prosjektene når målene sine
- Fremstå enhetlig og profesjonelle

Beste praksis innen prosjektgjennomføring





Linjeorganisasjon



Beslutningspunkt



Prosjektorganisasjon

3

Prosjektmodellene er stort sett like...
..... etterlevelsen er svært ulik!

Teori & praksis

UNINETT interweb: Mozilla Firefox

Logget inn som FEIDE-bruker bjorn |

Maler og oversikter Referater og statusrapporter Personelhåndbok Prosjektoversikt Kriseberedskap

Forside Prosjektrammeverk UNINETT AS UNINETT FAS UNINETT Nord UNINETT Sigma

Velkommen til UNINETTs prosjektweb

UNINETTs prosjektweb skal gi en oversikt over konsernets prosjekter, prosjektmetodikk og prosjektsyningsverktøy (dotProject). Her finner du blant annet en beskrivelse av UNINETTs prosjektrammeverk, tilgang til dotProject og en oversikt over pågående og gjennomførte prosjekter i konsernet, fordelt selskapsvis.

Prosjektrammeverk

Alle ekte prosjekter i UNINETT skal følge et felles rammeverk. Rammeverkets hovedmål er å bidra til å styrke ledelse og heve kvaliteten på prosjektene som gjennomføres i konsernet. Rammeverket er tilgjengelig når det gjelder prosjektmetodikk, men gir retningslinjer for faser og beslutningspunkter prosjektene skal gjennom. Mer om rammeverket finnes [her](#).

Idé B1 Planlegging B2 Gjennomføring B3 Overlevering B4 Gevinstrealisering

Linjeorganisasjon Beslutningspunkt Prosjektorganisasjon

UNINETT

B2 REFERAT

Spill til hv...
d dine inn...

ggning, oppdatert i...
storske da...

Done

MØTEINFORMASJON

Dato	Sted
03.10.2011	Af-sttt kontor
Tilstede	Forfall
All, Arild, Armas, Elin og Bjørn	Ingen.

PROSJEKTINFORMASJON

Prosjektnavn	Prosjektnummer
FAS Strategi og handlingsplan mot 2014 (SH 2014)	F1020042
Prosjektleder	Prosjektleder
All Hansen	Ian Aasen

SJECHELISTE

	Kommentar
Er oppdragsgiver innforstått med innhold og datoer i prosjektplanen?	Nei. Oppdragsgiver må orienteres.
Er det endringer fra B1 med hensyn til prosjektleder, prosjektleder og/eller finansiering? Hvis JA - se sjekkliste B1	Nei.
Er prosjektnummer oppgitt? Hvis ikke - hvor er kostnadene for planleggingsfasen ført?	Ja.
Sammenfaller overleveringstidspunktet med andre prosjekters overleveringstidspunkt? Vil linja være i stand til å ta imot prosjektet?	Linja vil være i stand til å ta imot.
Er formålet det samme som i mandatet? Er eventuelle endringer ok, spesielt med tanke på strategi/handlingsplan?	Nei. Formål endres. Se kommentar nedenfor.
Er prosjektmålet det samme som i mandatet? Er eventuelle endringer ok, spesielt med tanke på strategi/handlingsplan?	Ja, men dette må revideres slik at det er i henhold til sidplan.
Understøtter prosjektmålet selskaps strategihandlingsplan?	Ja.
Bidrar hver enkelt aktivitet til å oppnå prosjektmålet?	Ja.

Utaknummer: mul. 1.01 Mail starttiden: 24.08.2010 1

UNINETT interweb: Mozilla Firefox

Logget inn som FEIDE-bruker bjorn | Logg ut

Maler og oversikter Referater og statusrapporter Personelhåndbok Prosjektoversikt Kriseberedskap

Forside Prosjektrammeverk UNINETT AS UNINETT FAS UNINETT Nord UNINETT Sigma

UNINETT Prosjektrammeverk

Prosjektrammeverk

Idéfasen
B1 Planleggingsfasen
B2 Gjennomføringsfasen
B3 Overleveringsfasen
B4 Gevinstrealisering

Idé B1 Planlegging B2 Gjennomføring B3 Overlevering B4 Gevinstrealisering

Linjeorganisasjon Beslutningspunkt Prosjektorganisasjon

Hensikten med prosjektrammeverket er å bidra til en mer effektiv prosjektgjennomføring, samt øke kommunikasjon og gjennomsiktighet på tvers av UNINETTs avdelinger og selskap. Det skal skape en enhetlig fremtreden mot kunder og oppdragsivere, samt bidra til økt oversikt over hele konsernets virksomhet.

Done

prosjektverktøykasse:start [Feide OpenWiki] Mozilla Firefox

prosjektverktøykasse:start

OpenWiki

prosjektverktøykasse » start page

Verktøykasse for UNINETT prosjektrammeverk

Table of Contents

- Verktøykasse for UNINETT prosjektrammeverk
- Hensikten med wikien
- Hvordan kan du bidra?

Idé B1 Planlegging B2 Gjennomføring B3 Overlevering B4 Gevinstrealisering

Linjeorganisasjon Beslutningspunkt Prosjektorganisasjon

Hensikten med wikien

Hovedmålet med UNINETTs prosjektrammeverk er å styrke ledelsen av og heve kvaliteten på prosjektene som gjennomføres i konsernet. Skal dette målet realiseres er det viktig at alle som bruker rammeverket ser verdien av det og finner det nyttig. Da prosjektene som gjennomføres i UNINETT i stor grad varierer i størrelse, omfang og oppgaver, er det nødvendig med innspill fra brukerne for at rammeverket skal kunne passe alle prosjekter. Hensikten med wikien er dermed å skape en arena for å samle og diskutere innspill om rammeverkets videre utvikling. Det er også ønskelig å lage et sett med maler, som ikke skal være obligatoriske, men som skal være til støtte i prosjekter som krever mer enn minimumskravene til rammeverket.

Hvordan kan du bidra?

Du kan bidra ved å dele dine erfaringer vedrørende bruk av rammeverket. Lager du ofte dokumenter det ikke finnes maler for? Du er du såfortrålles allereis, og en mal kunne gjort arbeidet lettere. Kom med dine forslag og delte aksept i diskusjoner. Hold deg til de ulike overskriftene, så bidrar du samtidig til en ryddig og oversikkelig wiki.

Logget inn som: Bjørn H. Kopperud (bjorn@uninet.no)
prosjektverktøykassestart: Last modified: 2010/07/21 08:23 by tsuama@uninet.no

Edit Access Control Recent changes Index

Done



Porteføljestyring

- Kommer an på hvem du spør..
- Forankring i toppledelsen
 - ◆ Strategisk retning
 - ◆ Alle prosjekter
- Prosjektgodkjenningsgrupper
- Verktøy?




Forankring

- Forankring fra dag én
- Toppledelsen må stille krav!
- Hvorfor skal vi ha et prosjektrammeverk? Byråkratisering?
- Satt i sammenheng med øvrige prosesser (OU, lederplattform)



Kompetansetiltak / Opplæring

- Kompetanseforum for prosjektstyring
- Prosjektlederkurs
- Prosjekteierkurs
- Erfaringsmøter (Dette møtet...)

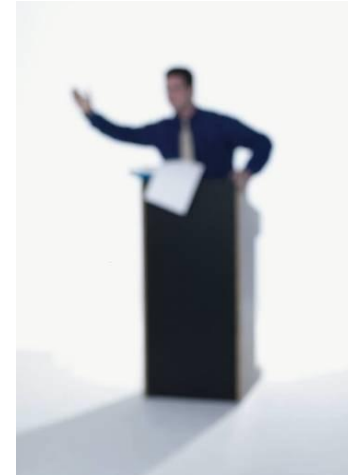



UNINETT's prosjektrammeverk
VEIEN VIDERE



UNINETT's behov

- Frigjøre **tid** hos prosjekteiere
 - Synliggjøre gevinster ved bruk av rammeverk
 - Overlevering og gevinstrealisering..
-
- Videreutvikle rammeverk, maler og kurs
 - ◆ Interne erfaringer
 - ◆ Erfaring fra andre offentlige aktører



Råd til DIFI

- Bli flinkere til å informere!
 - ◆ F.eks.: Erfaringsdatabase..
- Forum / tjeneste / møteplass for erfaringsutveksling
- Gevinstrealisering i praksis
- Overlevering?



UNINETT's prosjektrammeverk

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

